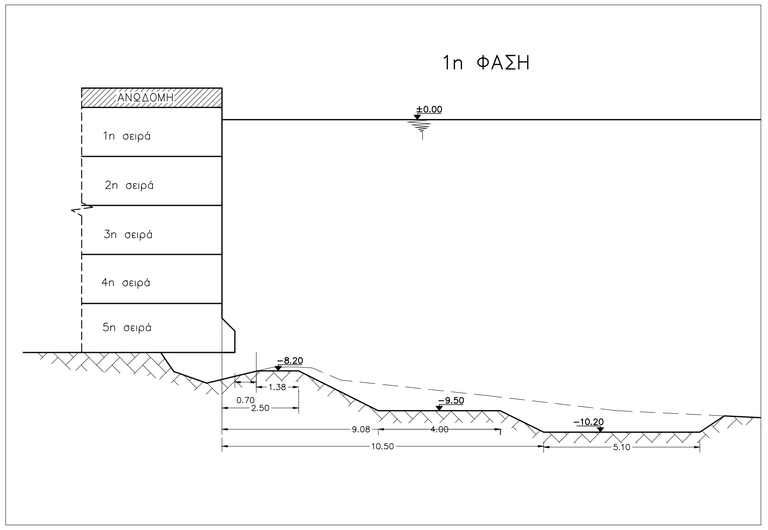

1Η ΦΑΣΗ:

- ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ/ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΕΙΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΟΣ
- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑ 16Μ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΣ

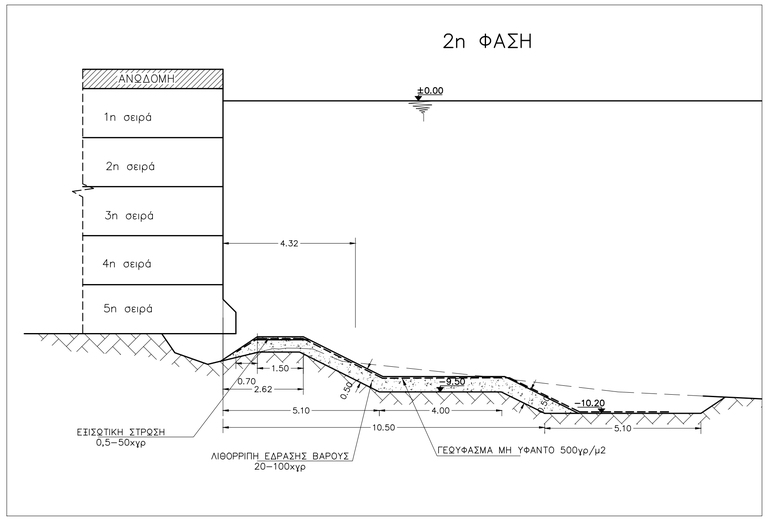

2Η ΦΑΣΗ:

- ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ 20-100KG ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 50CM
- ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 10CM ΣΤΗ ΣΤΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ 1,50Μ ΠΕΡΙΠΟΥ
- ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟΥ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

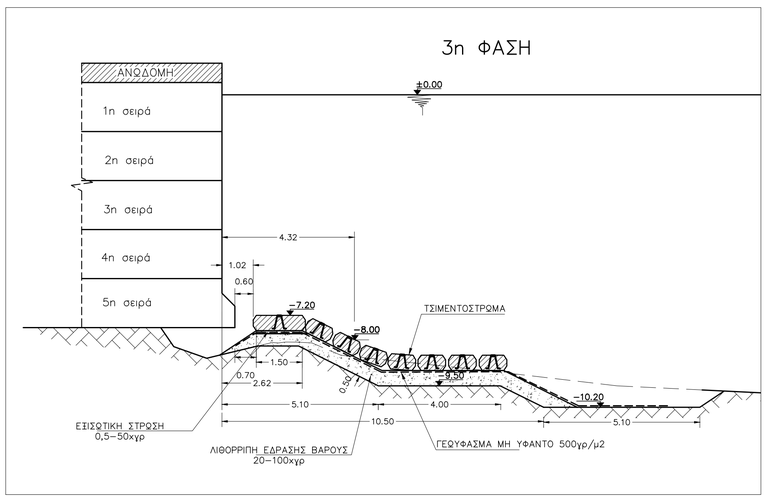

3Η ΦΑΣΗ:

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 60CM ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ

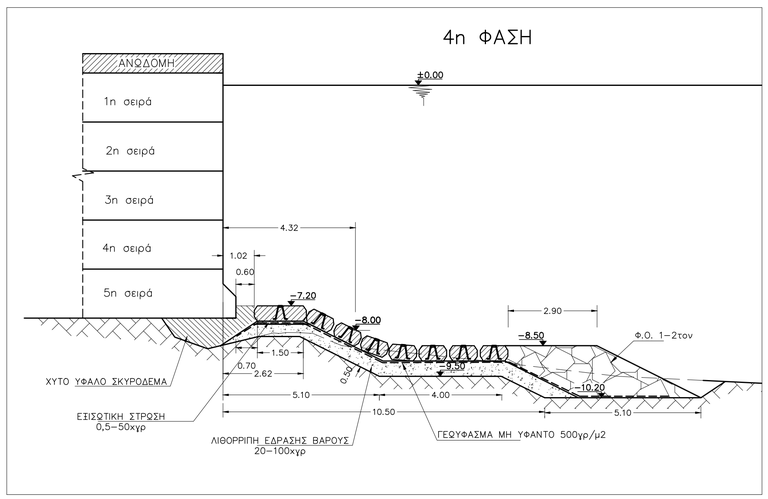

4Η ΦΑΣΗ:

- ΥΦΑΛΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C20/25 ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 1000x2000KG ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ -8,50Μ ΑΠΟ Μ.Σ.Θ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ
2. ΤΑ ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Σ.Θ.
3. ΠΡΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΝΕΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.
4. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ
5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΞΘΗΘΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙ ΥΠΟΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ
6. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΡΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ
7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
8. ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ
9. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ ΥΦΑΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ: C30/37
ΧΥΤΟ ΥΦΑΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: C20/25

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0	0	ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ	18.05.2017	Ι.Μ.
Α/Α ΤΡΟΠ.	ΕΝΔΕΙΞΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜ.	ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 & ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΛΑΜΑ 32 - 152 33 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 72 95 761 Fax. 210 72 43 358
e-mail: triton@tritonsa.gr http://www.tritonsa.gr

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΗΜΕΡ.	ΟΝΟΜΑ
ΜΕΛΕΤΗ	05/2017	Ι.Μ.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	05/2017	Γ.Γ.
ΕΛΕΓΧΟΣ	05/2017	Ν.Π.

ΑΡ.ΕΡΓΟΥ: 1244
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/2017
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/100
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: Λ06
ΤΡΟΠ.: 0

CAD FILE
PLOT SCALE

E.410-3-08_A1-ENGL/1
